


구정-1

독거노인 텃밭상자 지원사업

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
		완료	추진중	불가		
2,500	2,500	✓			노인장애인과 (노인지원팀)	홍수진 (☎7714)
요구사업 내용 (개요)	○ 취약 독거노인에게 집에서 직접 가꿀 수 있는 텃밭상자를 지원하여 독거노인 우울증 예방 및 삶의 의욕 증진 - 추진기간 : 2023. 5. ~ 2023. 12. - 지원대상 : 관내 노인맞춤돌봄서비스 이용자 중 희망하는 대상 250명					
추진계획	○ 2023. 2. : 독거노인 텃밭상자 지원 계획 수립 ○ 2023. 5. : 텃밭상자 구입 및 배부 완료 ○ 2023. 12. : 결과 보고					
추진실적	○ 독거노인 텃밭상자 지원 계획 수립[노인장애인과-10544(2023.2.27.)] ○ 독거노인 텃밭상자 구입[노인장애인과-23714(2023.5.11.)] ○ 독거노인 텃밭상자 배부 안내[노인장애인과-23037(2023.5.8.)]					
향후계획	○ 텃밭상자 만족도 조사 및 결과 보고					
관련사진	현 장 사 진					
	 					
기 타	- 관련 계획서 별첨					

구정-2

연수벚꽃길 경관개선 사업

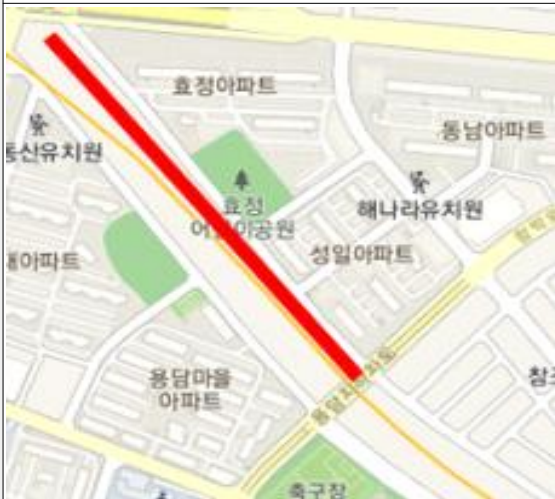반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
70,000	-	완료	추진중	불가	공원녹지과 (공원관리팀)	한세민 (☎8692)
			✓			
요구사업 내용 (개요)	○ 방치된 화단을 각 계절별 개화하는 다년생 꽃으로 식재 ○ 벤치 및 야자매트 교체					
추진계획	○ 2023. 3. ~ 4. : 설계서 검토 및 일상감사 의뢰 ○ 2023. 4. : 공사 계약의뢰 ○ 2023. 5. ~ 8. : 공사 착·준공					
추진실적	○ 2023. 2. 9. ~ 3. 20. : 실시설계 용역 착·준공 ○ 2023. 6. : 공사 계약의뢰					
향후계획	○ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착·준공					
관련사진	위치도			현장사진		
						
기타						

구정-3

연수구 내 공원에 꽃과 나무 명찰 설치(원도심)

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진 상황			추진부서 (담당팀)	담당자
5,000	-	완 료	추진중	불 가	공원녹지과 (공원관리팀)	김태현 (☎8693)
			✓			
요구사업 내 용 (개 요)	○ 연수구 관내 공원 내 수목 명찰 설치					
추진계획	○ 2023. 3. ~ 4. : 현장확인 및 설계 ○ 2023. 5. : 공사 계약의뢰 ○ 2023. 6. ~ 7. : 공사 착·준공					
추진실적	○ 2023. 3. ~ 4. : 현장확인 ○ 2023. 5. : 설계 ○ 2023. 6. : 공사 계약의뢰					
향후계획	○ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착·준공					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진(예시)		
						
기 타						


구정-4,5

부수지공원 정비사업(부수지 공원 환경개선,
부수지공원 운동 기구 및 차양설치)

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진 상황			추진부서 (담당팀)	담당자
112,000	-	완 료	추진중	불 가	공원녹지과 (공원관리팀)	한세민 (☎8692)
			✓			
요구사업 내 용 (개 요)	○ 잔디보강 및 관목식재, 경계석 설치, 노후 벤치 교체 ○ 노후 운동기구 교체 및 차양 설치					
추진계획	○ 2023. 3. ~ 4. : 설계서 검토 및 일상감사 의뢰 ○ 2023. 4. : 공사 계약의뢰 ○ 2023. 5. ~ 8. : 공사 착·준공					
추진실적	○ 2023. 2. 9. ~ 3. 20. : 실시설계 용역 착·준공 ○ 2023. 6. : 공사 계약의뢰					
향후계획	○ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착·준공					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
기 타						

동정-1

쉽이 있는 휴식공간 만들기

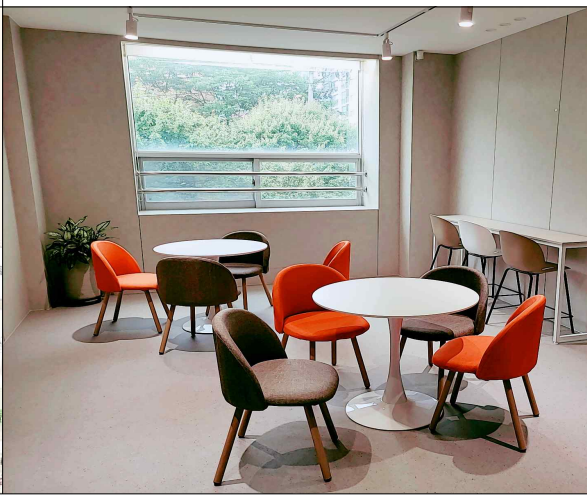반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진 상황			추진부서 (담당팀)	담당자
40,000	39,300	완 료	추진중	불 가	옥련2동 (행정민원팀)	최정기 (☎6063)
		✓				
요구사업 내 용 (개 요)	○ 쉽이 있는 휴식공간 만들기 - 옥련2동 행정복지센터 청사 복도에 휴게공간 설치 - 주민자치센터 및 작은도서관 이용 주민이 편의를 제공하고 힐링공간 마련					
추진계획	○ 2022. 10월 계획수립 ○ 2023. 4월 착공 ○ 2023. 5월 준공					
추진실적	○ 『쉽이 있는 휴식공간 만들기』 사업 완료 : 2023년 5월 - 공사 시행(내부 인테리어) : 19,400천원 - 자산취득(냉난방기, 테이블 등) : 19,900천원					
향후계획	○ 주민자치센터 프로그램 수강생 작품 전시 예정 ○ 휴식공간의 지속적 관리로 주민자치센터 이용주민의 만족도 제고					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
기 타						

동정-2

라일락 나무길 조성

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
42,000	-	완 료	추진중	불 가	공원녹지과 (공원관리팀)	김태현 (☎8693)
			✓			
요구사업 내 용 (개 요)	○ 비탈면 관목과 수풀정리와 조경식재를 통해 도시미관 개선 및 안전사고 방지					
추진계획	○ 2023. 3. ~ 4. : 현장확인 및 설계 ○ 2023. 5. : 공사 계약의뢰 ○ 2023. 6. ~ 7. : 공사 착·준공					
추진실적	○ 2023. 3. ~ 4. : 현장확인 ○ 2023. 5. : 설계 ○ 2023. 6. : 공사 계약의뢰					
향후계획	○ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착·준공					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
기 타						

동정-3

선학어린이공원 로고젝터 및 바닥돌 설치

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
16,000	16,154	완 료	추진중	불 가	공원녹지과 (공원관리팀)	이가연 (☎8695)
		✓				
요구사업 내 용 (개 요)	○ 공원 내 반려동물 에티켓 및 쓰레기 무단투기 방지 인식 제고를 위한 로고젝터와 바닥돌 설치					
추진계획	○ 2023. 4. : 공사 계약의뢰 ○ 2023. 4. ~ 5. : 공사 착·준공					
추진실적	○ 2023. 1. ~ 3. : 현장확인 및 설계검토 ○ 2023. 4. : 공사 계약의뢰 ○ 2023. 4. ~ 5. : 공사 착·준공					
향후계획	○ 사업 완료					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
기 타						

동정-4

선학별빛도서관 꽃길 조성

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
14,000	-	완료	추진중	불가	공원녹지과 (공원관리팀)	김태현 (☎8693)
			✓			
요구사업 내 용 (개 요)	○ 음식, 폐기물 무단투기 방지를 위한 인도와 잔디구간 경계면 관목 보식 및 수벽설치					
추진계획	○ 2023. 3. ~ 4. : 현장확인 및 설계 ○ 2023. 5. : 공사 계약의뢰 ○ 2023. 6. ~ 7. : 공사 착·준공					
추진실적	○ 2023. 3. ~ 4. : 현장확인 ○ 2023. 5. : 설계 ○ 2023. 6. : 공사 계약의뢰					
향후계획	○ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착·준공					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
기 타						

동정-5

연수1동 골목 도로 재포장

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
		완료	추진중	불가		
160,000	134,527	✓			건설과 (토목팀)	송유나 (☎8525)
요구사업 내용 (개요)	○ 연수1동(함박마을) 골목 도로 재포장 요청					
추진계획	○ 2023. 5. 3. : 공사 착공 ○ 2023. 5.30. : 공사 준공					
추진실적	○ 아스팔트 재포장 : 6,133㎡ ○ 아스팔트 재포장 : 448㎡					
향후계획	○ 주기적인 점검을 통해 하자 발생 시 즉시 정비 예정					
관련사진	위치도			현장사진		
						
기타						

동정-6

벚꽃로를 더 새롭게! 안전하게! (경관조명)

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
8,610	7,860	완료	추진중	불가	공원녹지과 (공원관리팀)	이가연 (☎8695)
		✓				
요구사업 내용 (개요)	○ 연수2동 벚꽃로 조명 추가 설치					
추진계획	○ 2023. 4. : 공사 계약의뢰 ○ 2023. 4. ~ 5. : 공사 착·준공					
추진실적	○ 2023. 1. ~ 3. : 현장확인 및 설계 ○ 2023. 4. : 경관조명 물품 계약의뢰 ○ 2023. 5. : 경관조명 설치 ○ 2023. 6. 5. : 조명 설치 완료					
향후계획	○ 정기 점검 및 수시 점검 실시하여 유지관리					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
기 타						

동정-7

벚꽃로를 더 새롭게! 안전하게!

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
2,500	-	완 료	추진중	불 가	건설과 시설관리팀	정재환 (☎8553)
			✓			
요구사업 내 용 (개 요)	○ 보행자와 자전거 간 안전사고 우려가 높아 교통안전표지 등 시각적인 안전장치 요청 - 자전거도로 노면표시 정비 - 교통안전표지판 설치					
추진계획	○ 2023. 5. : 추진계획 수립 및 착공 ○ 2023. 7. : 준공					
추진실적	○ 2023. 5. : 추진계획 수립 및 착공					
향후계획	○ 2023. 7. : 준공					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
기 타						


동정-8

새롭게 태어난 연수3동의 문화공원을 소개하여 드립니다~!

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
84,000	-	완료	추진중	불가	공원녹지과 (공원관리팀)	한세민 (☎8692)
			✓			
요구사업 내용 (개요)	○ 노후 운동기구, 정자, 벤치, 평상 등 교체 및 수리					
추진계획	○ 2023. 3. ~ 4. : 설계서 검토 및 일상감사 의뢰 ○ 2023. 4. : 공사 계약의뢰 ○ 2023. 5. ~ 8. : 공사 착·준공					
추진실적	○ 2023. 2. 9. ~ 3. 20. : 실시설계 용역 착·준공 ○ 2023. 6. : 공사 계약의뢰					
향후계획	○ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착·준공					
관련사진	위치도			현장사진		
						
기타						

동정-9

우리 동네 신호등은 안심하고 이용하세요~!

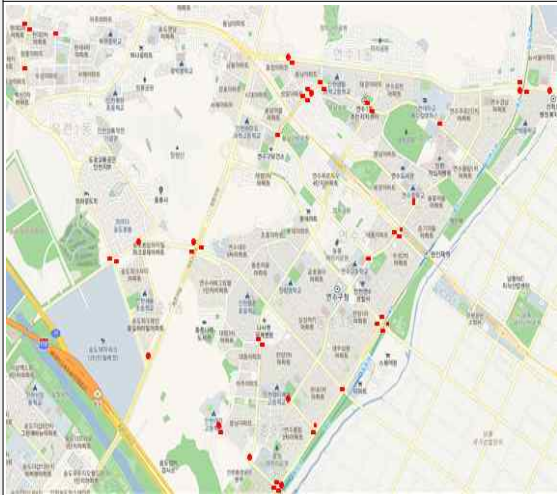반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
5,000천원	4,557천원	완 료	추진중	불 가	건설과 (전기팀)	김종문 (☎8564)
		✓				
요구사업 내 용 (개 요)	○ 사업기간 : 2023. 4. ~ 6. ○ 사업위치 : 연수구 원도심 일원 ○ 사업내용 : 가로등주 야광반사지 설치 49개소					
추진계획	○ 4월 야광반사지 설치 위치 선정 ○ 5월 착공 및 6월 준공					
추진실적	○ 2023. 5. 23. : 물품 계약의뢰 ○ 2023. 6. 23. : 설치완료					
향후계획						
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
기 타						

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
70,000	-	완료	추진중	불가	공원녹지과 (공원관리팀)	한세민 (☎8692)
			✓			
요구사업 내 용 (개 요)	○ 솔샘로43번길 일대 주변 환경 개선 - 청학동 큰빛교회에서 청량산 교회 구간 앞 녹지 구역에 산책로 조성 - 발 지압구간 등 설치 - 플라타너스 나무 제거 후 교목류,관목류 식재 및 야자매트 설치 등					
추진계획	○ 2023. 3. ~ 4. : 설계서 검토 및 일상감사 의뢰 ○ 2023. 4. : 공사 계약의뢰 ○ 2023. 5. ~ 8. : 공사 착·준공					
추진실적	○ 2023. 2. 9. ~ 3. 20. : 실시설계 용역 착·준공 ○ 2023. 6. : 공사 계약의뢰					
향후계획	○ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착·준공					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
기 타						

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
80,000	36,923	완료	추진중	불가	공원녹지과 (산림팀)	곽수형 (☎8712)
		✓				
요구사업 내용 (개요)	○ 봉재산 데크계단 20m 1개소 설치					
추진계획	○ 2023. 4. 5. ~ 4. 29.(완료)					
추진실적	○ 2023. 4. 5. ~ 4. 29.(완료)					
향후계획	○ 2023. 5. ~ : 유지관리					
관련사진	위치도			현장사진		
						
기타						

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진 상황			추진부서 (담당팀)	담당자
		완 료	추진중	불 가		
90,000	72,245	✓			건설과 (토목팀)	송유나 (☎8525)
요구사업 내 용 (개 요)	○ 무지개아파트 부근 보도 미끄러움으로 인해 보도블록 교체 요청					
추진계획	○ 2023. 3.29. : 공사 착공 ○ 2023. 4.25. : 공사 준공					
추진실적	○ 2023. 4.25. : 공사 준공 - 공사 준공보도블록 재포장 : 863㎡ / 안전유도블록 설치 : 90㎡ - 도로경계석 교체 : 454m					
향후계획	○ 주기적인 점검을 통해 하자 발생 시 즉시 정비 예정					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
기 타						

동정-13

행복길 개선 사업

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
10,000	10,000	완료	추진중	불가	총무과 (통신운영팀)	백석현 (☎7192)
		✓				
요구사업 내 용 (개 요)	○ 원인재로 14 (동춘2동 행복길) 구민의 안전을 위한 생활안전 CCTV 설치 - 고정형 CCTV 2대 설치					
추진계획	○ 2023. 3. : 계획수립 (연수경찰서 생활안전과 범의예방진단팀(CPO) 의견수립) ○ 2023. 4. : 행정예고 ○ 2023. 5. : 착공 ○ 2023. 6. : 준공					
추진실적	○ 2023. 6. : CCTV 2대 설치, 비상벨 1대 설치					
향후계획	○ 행복길 내 범의예방을 위한 모니터링 집중강화					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진 (설치 후)		
						
기 타						

동정-14

꽃길 조성 및 조명등 설치

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
68,000	68,754	완 료	추진중	불 가	송도시설관리과 (송도공원)	장지우 (☎8303)
		✓				
요구사업 내 용 (개 요)	○ 첨단6호 연결녹지(송도동 190-3) 꽃길 조성 - 철쭉, 장미덩쿨, 개나리 등 꽃길 등을 조성해달라					
추진계획	○ 2023. 4. : 계획수립, ○ 2023. 4. ~5. : 착공, 준공 등					
추진실적	○ 2023. 4. : 첨단6호 연결녹지 꽃길조성사업 추진 계획 수립 ○ 2023. 5. : 사업 착공 ○ 2023. 6. : 사업 준공					
향후계획	○ 녹지, 시설 상시 운영					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
기 타	○ 민원인 요청에 따라 나비형 의자(아치형, 일반형) 추가					

동정-15

주민 이동이 많은 공원 주위로 공공 식수대 설치

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
30,000	-	완료	추진중	불가	송도시설관리과 (송도공원)	장지우 (☎8303)
			✓			
요구사업 내용 (개요)	○ 주민 이동이 많은 공원 주위로 공공 식수대 설치 - 누리공원 등에 무상 식수대를 설치					
추진계획	○ 2023. 5. ~ 6. : 설계 및 계획수립 ○ 2023. 6. ~ 7. : 착공, 준공 등					
추진실적	○ 2023. 5. : 식수대 설치 장소 및 지중 상수도 배관 확인 ○ 2023. 6. : 계획수립					
향후계획	○ 2023. 7. ~ 8. : 착공, 준공 등					
관련사진	위치도			현장사진		
						
기타	○ 민원인 요청에 따라 식수대 설치 장소 지정					


반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진 상황			추진부서 (담당팀)	담당자
50,000	53,233	완 료	추진중	불 가	송도시설관리과 (송도공원)	김재찬 (☎8302)
		✓				
요구사업 내 용 (개 요)	○ 어린이들의 안전한 통학을 위한 쉼터 조성 요청 - 무더운 여름이나 비가 오는 짙곳은 날씨에 주민들이 대피할 수 있는 그늘이 있는 쉼터를 조성					
추진계획	○ 2023. 2. : 어울림공원 휴게쉼터 계획 수립 ○ 2023. 2. ~3. : 어울림공원 휴게쉼터 착공 및 준공					
추진실적	○ 2023. 2. : 어울림공원 휴게쉼터 계획 수립 ○ 2023. 3. : 어울림공원 휴게쉼터 착공 ○ 2023. 4. : 어울림공원 휴게쉼터 준공					
향후계획	○ 공원 및 녹지, 시설 상시 운영					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
기 타						

반영예산 (천원)	소요예산 (천원)	추진상황			추진부서 (담당팀)	담당자
		완료	추진중	불가		
350,000	-		✓		토지정보과 (스마트도시팀)	정재욱 (☎8612)
요구사업 내 용 (개 요)	○ 스마트 횡단보도 설치 : 3개소 횡단보도 10개 - 은송초등학교 앞 사거리, 송도4동 98-2번지(기아차 앞) 사거리, 능허대 초등학교 정문 앞					
추진계획	○ 2023. 5. : 실시설계 완료 ○ 2023. 6. : 일상 및 계약심사 / 발주 ○ 2023. 7. ~ 10. : 공사착공 및 준공					
추진실적	○ 2023. 5. 4. : 교통안전시설 심의요청 (→연수경찰서) ○ 2023. 5. 16. : 관계기관 사전 협의 (시 교통정보운영과, 경찰서 등) ○ 2023. 6. : 일상 및 계약심사 / 발주					
향후계획	○ 2023. 7. ~ 10. : 공사착공 및 준공					
관련사진 (별첨 참조)	위 치 도			현 장 사 진		
기 타						

□ 위치도 및 현장사진



1. 송도동 98-2번지 앞

기아자동차 앞 사거리 (송도4동)

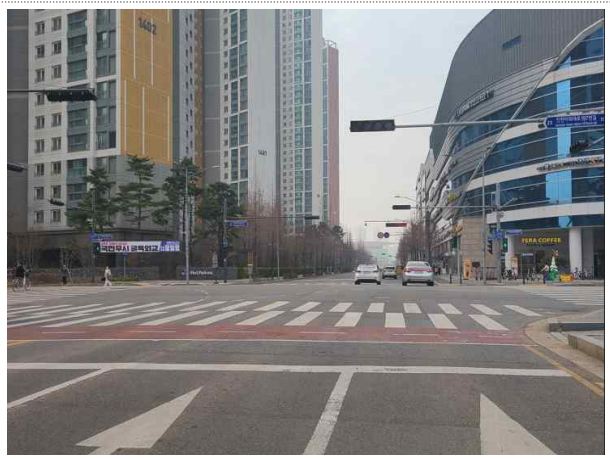

2. 송도동 314-1번지

은송초등학교 앞 사거리 (송도5동)

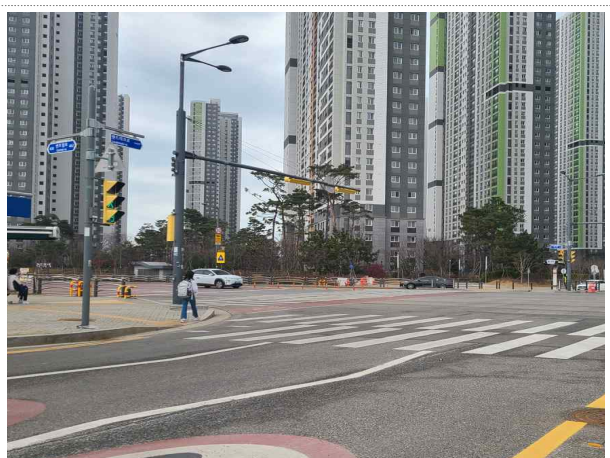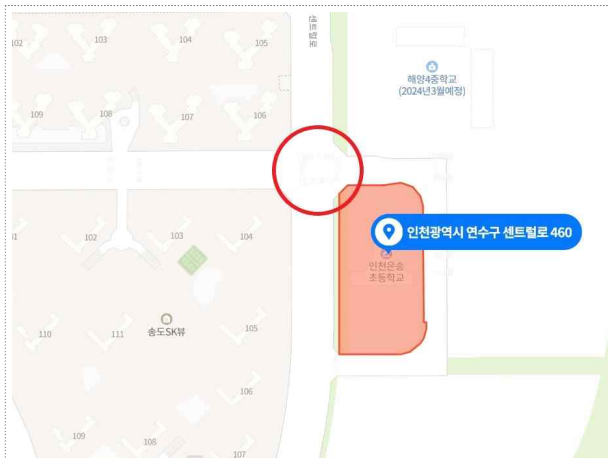

3. 능허대 초등학교 정문 앞

