

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'23~'25	270	55%	정상추진

공약실천계획

정책목표	공원 내 산책로 친환경 고효율 등기구로 교체 및 야간 경관 조명 설치하여 밝고 안전한 밤을 지닌 공원의 모습 실현																											
정책개요	○ 사업대상 : 대학공원(연수3동 580번지), 문화공원(연수3동 578번지) ○ 사업기간 : 2023. ~ 2025. ○ 총사업비 : 270백만원 ○ 사업내용 - 대학공원 : 암대 86개 및 구형LED램프 172개 교체(완료) - 문화공원 : 산책로 지중등, 벚꽃조명 등 경관 조명 설치																											
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
	대학공원 LED교체																											
	문화공원 조명 설치																											
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026										
	270					20				20				230														
변경사항	2024년 ~ 2025년 소요예산 변동																											

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
공원 내 조명시설 공사 공정률 (누적)	목표	100%		30%	60%	100%	
				대학공원 둘레길 LED 교체	대학공원 중턱, 정상 LED 교체	문화공원 경관조명	
	실적	55%		50%	55%		
				대학공원 LED등기구 교체 완료	대학공원 중턱, 정상 교체 공사 진행 중		

세부 추진 내용

- 2023. 6. 18. : 친환경 고효율 공원등 40본, LED등기구 80개소 교체 완료
- 2023. 9.~ 10. : 대학공원 48본 LED등기구 96개소 교체 완료
- 2024. 3. 10. : 대학공원 13본, LED등기구 26개소 교체공사 착공

예산집행현황

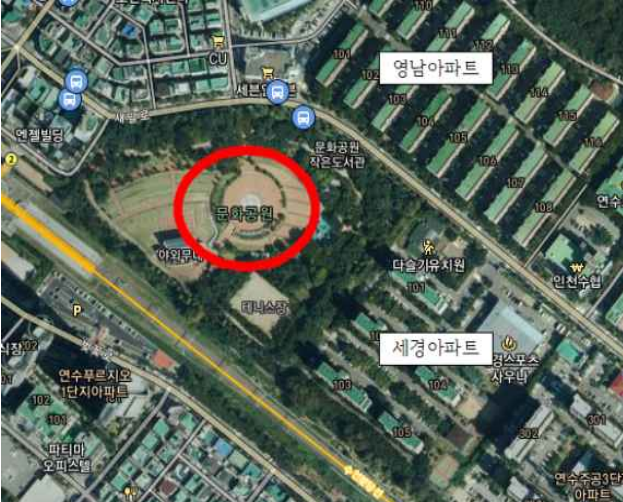
(단위 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025	2026
투 계	합계	270		20	150	100	
	국						
	시						
	구	270		20	150	100	
	기타						
집 행 액	합계	40	0	20	20		
	국						
	시						
	구	40	0	20	20		
	기타						

향 후 계 획

- 2025. 1. ~ 3. : 문화공원 야간 경관 현장 조사
- 2025. 4. ~ 6. : 『문화공원 야간 경관 조명 설치 공사』 설계 및 입찰 공고
- 2025. 7. ~ 9. : 『문화공원 야간 경관 조명 설치 공사』 착·준공

현장사진

	
대학공원(연수3동 580번지)	문화공원(연수3동 578번지)
